



**SECODUVI**  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
 DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
 Dirección de Obras Públicas



00171

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO NÚM. PF/PR/089/18 Y CONVENIOS MODIFICATORIOS NÚM. PF/PR/089/A/18, PF/PR/089/B/18, PF/PR/089/C/18, PF/PR/089/D/18, PF/PR/089/E/18 Y PF/PR/089/F/18.**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2020, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DEL RESIDENTE DE OBRA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADAS EN EL KM 1.5 S/N DE LA CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA, TLAXCALA, TLAX., LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

EL C. ARQ. RENÉ CUAPIO MORALES EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

EL C. ING. LUIS MANUEL LEGORRETA MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONTRATISTA "CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN LOGÍSTICA, S.A. DE C.V."

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 170 Y 171 DE SU REGLAMENTO, ASI COMO LA CLÁUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

**I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.**

NÚMERO DE CONTRATO: PF/PR/089/18

FECHA DE FORMALIZACIÓN: 16 DE NOVIEMBRE DE 2018

NÚMERO DE CONVENIO: PF/PR/089/A/18, PF/PR/089/B/18, PF/PR/089/C/18, PF/PR/089/D/18, PF/PR/089/E/18 Y PF/PR/089/F/18.

FECHA DE FORMALIZACIÓN: 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, 22 DE DICIEMBRE DE 2018, 03 DE JUNIO DE 2019, 05 DE JULIO DE 2019, 26 DE JULIO DE 2019 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 RESPECTIVAMENTE.

OBJETO DEL CONTRATO: COMPLEJO VIAL METROPOLITANO TLAXCALA (PUENTE ELEVADO) EN LA CARRETERA PUEBLA - BELEM (INICIO - KM 30+000) Y EN LA CARRETERA SAN MARTÍN TEXMELUCAN - TLAXCALA - EL MOLINITO (FINAL - 30+660).

OPERA  
 EJERCICIO 2018  
 "PROGRAMAS REGIONALES"  
 ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.  
 "ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

RECIBIDO  
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2018  
 26 DE JULIO DE 2019  
 TLAXCALA

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO NÚM. PF/PR/089/18 Y CONVENIOS MODIFICATORIOS NÚM. PF/PR/089/A/18, PF/PR/089/B/18, PF/PR/089/C/18, PF/PR/089/D/18, PF/PR/089/E/18 Y PF/PR/089/F/18.**

CONSISTENTE EN: TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO Y ESTRUCTURAS

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: DEL PROGRAMA "FONDO DE APORTACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2018" \$ 149,661,326.20 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 20/100 M.N) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: DEL PROGRAMA "PROGRAMAS REGIONALES (PR) 2018" \$ 160,747,892.65 (CIENTO SESENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

MONTO ORIGINAL DE CONVENIO: PF/PR/089/B/18, DEL PROGRAMA "PROGRAMAS REGIONALES (PR) 2018" ES DE \$31,060,107.35 (TREINTA Y UN MILLONES SESENTA MIL CIENTO SIETE PESOS 35/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

MONTO POR CANCELAR: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE I.V.A

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONVENIO PF/PR/089/A/18:

PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONVENIO PF/PR/089/C/18:

PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONVENIO PF/PR/089/E/18:

PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONVENIO PF/PR/089/F/18:

OPERADO  
EJERCICIO 2018  
"PROGRAMAS REGIONALES"  
280 DÍAS NATURALES  
210 DÍAS NATURALES  
262 DÍAS NATURALES  
314 DÍAS NATURALES  
335 DÍAS NATURALES

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:

21 DE NOVIEMBRE DE 2018

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:

27 DE AGOSTO DE 2019



**SECODUVI**  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
Dirección de Obras Públicas



**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO NÚM. PF/PR/089/18 Y CONVENIOS MODIFICATORIOS NÚM. PF/PR/089/A/18, PF/PR/089/B/18, PF/PR/089/C/18, PF/PR/089/D/18, PF/PR/089/E/18 Y PF/PR/089/F/18.**

FECHA DE INICIO SEGÚN CONVENIO PF/PR/089/C/18: 21 DE NOVIEMBRE DE 2018  
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONVENIO PF/PR/089/C/18: 21 DE OCTUBRE DE 2019

**II.- MODIFICACIONES.**

DIFERIMIENTO DE INICIO POR PAGO DE ANTICIPO: NO APLICA

CONVENIOS MODIFICATORIOS EN PLAZO O IMPORTE DE LOS TRABAJOS A LO ORIGINALMENTE PACTADO: PF/PR/089/A/18, PF/PR/089/B/18, PF/PR/089/C/18, PF/PR/089/D/18, PF/PR/089/E/18 Y PF/PR/089/F/18.

MONTO SEGÚN CONVENIO PF/PR/089/B/18: DEL PROGRAMA "PROGRAMAS REGIONALES (PR) 2018" ES DE \$31,060,107.35 (TREINTA Y UN MILLONES SESENTA MIL CIENTO SIETE PESOS 35/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

OPERADO  
FONDO DE ASIGNACIONES PARA  
EL FORTALECIMIENTO DE LAS  
ENTIDADES FEDERATIVAS RFA

MONTO MODIFICADO: DEL PROGRAMA "PROGRAMAS REGIONALES (PR) 2018" ES DE \$31,060,107.35 (TREINTA Y UN MILLONES SESENTA MIL CIENTO SIETE PESOS 35/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

PORCENTAJE DE MODIFICACIÓN: 10.01 %

MONTO REAL EJERCIDO (1): \$341,469,326.20 (TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 20/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.

OPERADO  
EJERCICIO 2018  
"PROGRAMAS REGIONALES"  
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES AJENOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.  
"ESTA OBRA PÚBLICA SE FINANCIÓ CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES Y ESTATALES"

MONTO PAGADO POR AJUSTE DE COSTOS (2): \$0.00 PESOS 00/100 M.N.



**SECODUVI**  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
Dirección de Obras Públicas



**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO NÚM. PF/PR/089/18 Y CONVENIOS MODIFICATORIOS NÚM. PF/PR/089/A/18, PF/PR/089/B/18, PF/PR/089/C/18, PF/PR/089/D/18, PF/PR/089/E/18 Y PF/PR/089/F/18.**

MONTO TOTAL EJERCIDO (1+2): \$341,469,326.20 (TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 20/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.

FECHA DE INICIO REAL: 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DE PLAZO: CIENTO VEINTICINCO DIAS NATURALES


FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 21 DE OCTUBRE DE 2019

PLAZO DE EJECUCIÓN REAL: 335 DÍAS NATURALES.


**III. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.**

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

Estimaciones al contrato y convenio del programa: FONDO DE APORTACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2018"



ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	FECHA DE PAGO
01	Del 21 de noviembre de 2018 al 30 de noviembre de 2018	\$ 32,567,081.53	\$ 5,210,733.04	\$ 37,777,814.57	24/12/18
02	Del 01 de diciembre de 2018 al 08 de diciembre de 2018	\$ 45,645,245.49	\$ 7,303,239.28	\$ 52,948,484.77	24/12/18
03	Del 09 de diciembre de 2018 al 15 de diciembre de 2018	\$ 21,662,304.77	\$ 3,465,968.76	\$ 25,128,273.53	28/01/2019
04	Del 16 de diciembre de 2018 al 22 de diciembre de 2018	\$ 29,143,752.87	\$ 4,663,000.46	\$ 33,806,753.33	21/02/2019
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$129,018,384.66</b>	<b>\$20,642,941.54</b>	<b>\$149,661,326.20</b>	



**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO NÚM. PF/PR/089/18 Y CONVENIOS MODIFICATORIOS NÚM. PF/PR/089/A/18, PF/PR/089/B/18, PF/PR/089/C/18, PF/PR/089/D/18, PF/PR/089/E/18 Y PF/PR/089/F/18.**

Estimaciones al contrato del programa "PROGRAMAS REGIONALES (PR) 2018":

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	FECHA DE PAGO
05	Del 23 de diciembre de 2018 al 21 de enero de 2019	\$ 20,906,249.37	\$ 3,344,999.90	\$ 24,251,249.27	15/03/19
06	Del 22 de enero de 2019 al 20 de febrero de 2019	\$ 12,197,706.57	\$ 1,951,633.05	\$ 14,149,339.62	10/04/19
07	Del 21 de febrero de 2019 al 22 de marzo de 2019	\$ 14,927,382.13	\$ 2,388,381.14	\$ 17,315,763.27	29/04/2019
08	Del 23 de marzo de 2019 al 31 de marzo de 2019	\$ 15,972,642.07	\$ 2,555,622.73	\$ 18,528,264.80	24/05/2019
09	Del 01 de abril de 2019 al 15 de abril de 2019	\$ 17,311,259.41	\$ 2,769,801.51	\$ 20,081,060.92	10/06/2019
10	Del 16 de abril de 2019 al 30 de abril de 2019	\$ 30,506,903.95	\$ 4,881,104.63	\$ 35,388,008.58	24/06/2019
11	Del 01 de mayo de 2019 al 31 de mayo de 2019	\$ 10,627,394.30	\$ 1,700,383.09	\$ 12,327,777.39	24/07/2019
12	Del 01 de junio de 2019 al 30 de junio de 2019	\$ 12,230,717.80	\$ 1,956,914.85	\$ 14,187,632.65	13/08/2019
13	Del 01 de julio de 2019 al 31 de julio de 2019	\$ 8,846,794.85	\$ 1,415,487.18	\$ 10,262,282.03	04/09/2019
14	Del 01 de agosto de 2019 al 31 de agosto de 2019	\$ 14,609,319.35	\$ 2,337,491.10	\$ 16,946,810.45	07/10/2019
15	Del 01 de septiembre de 2019 al 30 de septiembre de 2019	\$ 6,650,153.58	\$ 1,064,024.57	\$ 7,714,178.15	25/10/2019
16	Del 01 de octubre de 2019 al 21 de octubre de 2019	\$ 565,200.75	\$ 90,432.12	\$ 655,632.87	30/10/2019
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$165,351,724.14</b>	<b>\$26,456,275.86</b>	<b>\$191,808,000.00</b>	

OPERADO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016

OPERADO EJERCICIO 2018 "PROGRAMAS REGIONALES"  
ESTO PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. ESTÁ PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA. ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

**DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL DEL PROGRAMA "PROGRAMAS REGIONALES (PR) 2018"**

NO.	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO SIN IVA	FECHA DE PAGO
	DEL	AL	AL	AL			
11	DEL	01/03/15	AL	15/03/15	\$ 565,200.75	\$165,351,724.14	30/10/2019

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO NÚM. PF/PR/089/18 Y CONVENIOS MODIFICATORIOS NÚM. PF/PR/089/A/18, PF/PR/089/B/18, PF/PR/089/C/18, PF/PR/089/D/18, PF/PR/089/E/18 Y PF/PR/089/F/18.**

III.1. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REDUCCION DE VOLUMENES YA SEA CANCELADOS TOTAL O PARCIALMENTE, POR UN MONTO TOTAL DE 127,679,000.36 (CIENTO VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS 36/100M.N) INCLUYE IVA, MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO ANEXO NUMERO I.

III.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REALIZACIÓN DE CONCEPTOS ADICIONALES A LOS PREVISTOS EN EL CONTRATO, POR UN MONTO TOTAL \$ 14,197,848.87 (CATORCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 87/100M.N) INCLUYE IVA, MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO ANEXO NUMERO II.

III.3. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REALIZACIÓN DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS A LOS PREVISTOS EN EL CONTRATO, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 113,481,151.49 (CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 49/100M.N) INCLUYE IVA, MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO ANEXO NUMERO III.

**IV.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO. 2403375 EMITIDA POR SOFIMEX, INSTITUCIONES DE GARANTÍAS S.A., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

POR SU PARTE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, ING. LUIS MANUEL LEGORRETA MARTINEZ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO

OPERADO  
FONDO DE APORTACIONES PARA  
EL FORTALECIMIENTO DE LAS  
ENTIDADES FEDERATIVAS 2018

OPERADO  
EJERCICIO 2018  
PROGRAMAS REGIONALES  
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA. ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES



**SECODUVI**  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
Dirección de Obras Públicas



**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO NÚM. PF/PR/089/18 Y CONVENIOS MODIFICATORIOS NÚM. PF/PR/089/A/18, PF/PR/089/B/18, PF/PR/089/C/18, PF/PR/089/D/18, PF/PR/089/E/18 Y PF/PR/089/F/18.**


Y VIVIENDA, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO PF/PR/089/18 Y CONVENIOS NÚMERO PF/PR/089/A/18 Y PF/PR/089/B/18, PF/PR/089/C/18, PF/PR/089/D/18, PF/PR/089/E/18 Y PF/PR/089/F/18 ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

**MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES**


CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2020, EN LA CD. DE TLAXCALA, TLAX., LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL  
ESTADO DE TLAXCALA**

**POR EL CONTRATISTA  
"CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACION  
LOGÍSTICA, S.A. DE C.V."**

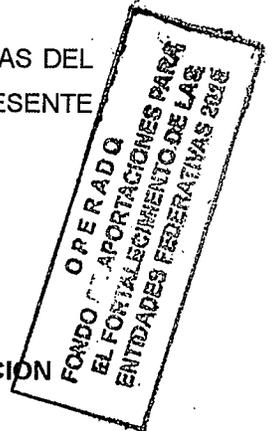

  
**ARO RENÉ CUAPIO MORALES  
RESIDENTE DE OBRA**

  
**C. ING. LUIS MANUEL LECORRETA MARTÍNEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA**

