



Tlaxcala, Tlax. a 21 de agosto de 2019
SEC-DA-1495/2019
Asunto: solicito visita en conjunto.

LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA JORGE LÓPEZ MÁRQUEZ
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA
DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
PRESENTE


Derivado de la auditoría de número **UAG-AOR-227-2019 TLAX/PROAGUA-SECODUVI**, practicada por la Secretaría de Función Pública, aplicada a los recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (**PROAGUA**) correspondientes al ejercicio presupuestal dos mil dieciocho y en seguimiento a la **observación número dos tipificada como: "Deficiencias en la ejecución de los trabajos (deficiencias técnicas) ... como resultado de la inspección física, se observaron, filtraciones de agua en los muros de concreto de los Reactores Anaerobios de Flujo Ascendente (RAFA 1 y RAFA 2) y los sedimentadores primario y secundario de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, asimismo, de la ejecución del concepto "08.1.2.15 Impermeabilización de azoteas a base de sellador e imprimador 2 capas revest impermeable con membrana de ref Intermedio aparente" en la azotea del área administrativa de la Planta de Tratamiento, se observaron deficiencias técnicas constructivas al presentar abolsamiento y desprendimiento del impermeabilizante en una área aproximada de 60.61 metros cuadrados, dichas observaciones se hicieron constar en la cédula de inspección de campo del 12 de junio de 2019..."**.

Y **observación número tres tipificada como: "Pagos improcedentes (Conceptos de obra pagados no ejecutados) ...el grupo auditor advirtió conceptos de obra no ejecutados por \$ 101,657.11 que se refieren principalmente a la inoculación, estabilización y puesta en marcha de la planta de tratamiento, suministro y colocación de pisos, azulejo y adocreto hexagoncl..."**.

Por lo anteriormente expuesto le solicito de su valiosa colaboración con el propósito de que gire sus apreciables instrucciones al personal responsable para que a la brevedad posible se lleve a cabo una visita de inspección física en conjunto a la obra denominada "Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Intermunicipal "Nativitas", correspondiente al contrato de obra pública número PF/PTAR/027/18, con el propósito de verificar correcta ejecución de los trabajos y así complementar la documentación que será remitida a la S.F.P para solventar las observaciones antes mencionadas y así liberar al Estado de esta responsabilidad.

Sin otro particular y seguro de contar con su apoyo, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


C.P. CARLOS SÁNCHEZ TAMAYO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.c.p. CONTADOR PÚBLICO MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ. – Contralór del Ejecutivo. – Para su Conocimiento. – Presente.
- C.c.p. ARQ. FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACTZI. – Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. – Mismo fin.
- C.c.p. ING. PEDRO BAÑUELOS MORALES. – Director de Obras Públicas. – Mismo fin.
- C.c.p. ING. ARQ. HILARIO ANTONIO TEXIS SÁNCHEZ. – Encargado de la Jefatura del Departamento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. – Mismo Fin.
- C.c.p. ING. CARLOS OTERO SÁNCHEZ. – Residente de Obra adscrito a la Dirección de Obras Públicas. – Para su Conocimiento y Atención. – Presente.

Archivo
CST/grh



Tlaxcala, Tlax. a 21 de agosto de 2019

SEC-DA-1495/2019

Asunto: solicito visita en conjunto.

LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA **JORGE LÓPEZ MÁRQUEZ**
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA
DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
PRESENTE


Derivado de la auditoría de número **UAG-AOR-227-2019 TLAX/PROAGUA-SECODUVI**, practicada por la Secretaría de Función Pública, aplicada a los recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (**PROAGUA**) correspondientes al ejercicio presupuestal dos mil dieciocho y en seguimiento a la observación número dos tipificada como: *"Deficiencias en la ejecución de los trabajos (deficiencias técnicas) ... como resultado de la inspección física, se observaron, filtraciones de agua en los muros de concreto de los Reactores Anaerobios de Flujo Ascendente (RAFA 1 y RAFA 2) y los sedimentadores primario y secundario de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, asimismo, de la ejecución del concepto "08.1.2.15 Impermeabilización de azoteas a base de sellador e imprimador 2 capas revest impermeable con membrana de ref Intermedio aparente" en la azotea del área administrativa de la Planta de Tratamiento, se observaron deficiencias técnicas constructivas al presentar abolsamiento y desprendimiento del impermeabilizante en una área aproximada de 60.61 metros cuadrados, dichas observaciones se hicieron constar en la cedula de inspección de campo del 12 de junio de 2019..."*.

Y observación número tres tipificada como: *"Pagos improcedentes (Conceptos de obra pagados no ejecutados) ...el grupo auditor advirtió conceptos de obra no ejecutados por \$ 101,657.11 que se refieren principalmente a la inoculación, estabilización y puesta en marcha de la planta de tratamiento, suministro y colocación de pisos, azulejo y adocreto hexagonal..."*.

Por lo anteriormente expuesto le solicito de su valiosa colaboración con el propósito de que gire sus apreciables instrucciones al personal responsable para que a la brevedad posible se lleve a cabo una visita de inspección física en conjunto a la obra denominada "Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Intermunicipal "Nativitas", correspondiente al contrato de obra pública número PF/PTAR/027/18, con el propósito de verificar correcta ejecución de los trabajos y así complementar la documentación que será remitida a la S.F.P para solventar las observaciones antes mencionadas y así liberar al Estado de esta responsabilidad.

Sin otro particular y seguro de contar con su apoyo, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


C.P. CARLOS SÁNCHEZ TAMAYO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



C.c.p. CONTADOR PÚBLICO MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ. – Contralor del Ejecutivo. – Para su Conocimiento. – Presente.
C.c.p. ARQ. FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACTZI. – Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. – Mismo fin.
C.c.p. ING. PEDRO BAÑUELOS MORALES. – Director de Obras Públicas. – Mismo fin.
C.c.p. ING. ARQ. HILARIO ANTONIO TESIS SÁNCHEZ. – Encargado de la Jefatura del Departamento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. – Mismo Fin.
C.c.p. ING. CARLOS OTERO SÁNCHEZ. – Residente de Obra adscrito a la Dirección de Obras Públicas. – Para su Conocimiento y Atención. – Presente.
Archivo
CST/grh



C.P. Tere: Registros e integrar en control de folios
Luz Leonel: Realizar visita de inspección física conjuntamente con Secoam
dictaminar y enviar a SIFOP.

FOLIO	FECHA CAPTURA	FECHA DOCUMENTO	REFERENCIA	CLAVE		
5333 ✓	22/08/2019	22/08/2019	Oficio	SEC-DA-1505/2019		
NOMBRE						
C.P. Carlos Sánchez Tamayo						
CARGO			DEPENDENCIA			
Director Administrativo de la			Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda.			
ASUNTO						
En alcance al oficio SEC-DA-1495/2019 remite propuesta de solventación de observaciones determinada dentro de la auditoría UAG-AOR-227-2019 TLAX/PROAGUA-SECODUVI, así mismo solicita girar instrucciones a quien corresponda para lleva a cabo una visita de inspección física en conjunto a la obra "Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Intermunicipal Nativitas".						
TRAMITE		TURNADO				
<input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Importante <input type="checkbox"/> Urgente		<input type="checkbox"/> Despacho <input type="checkbox"/> Dirección Administrativa <input type="checkbox"/> Dirección Jurídica <input type="checkbox"/> Dirección de Modernización a la Administración Pública y Participación Social <input checked="" type="checkbox"/> Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría <input type="checkbox"/> Dirección de Informática <input type="checkbox"/> Contraloría Interna				
INSTRUCCIONES						
<input checked="" type="checkbox"/> Dar seguimiento <input checked="" type="checkbox"/> Hacerse cargo <input checked="" type="checkbox"/> Investigar asunto <input type="checkbox"/> Proporcionar antecedentes <input type="checkbox"/> Informar en acuerdo <input type="checkbox"/> Comentar con nota informativa <input type="checkbox"/> Asistir <input type="checkbox"/> Asistir en representación <input type="checkbox"/> Agradecer <input type="checkbox"/> Disculpar <input type="checkbox"/> Valorar <input type="checkbox"/> Contestar con firma del titular					<input type="checkbox"/> Preparar síntesis ejecutiva <input type="checkbox"/> Archivar <input type="checkbox"/> Contestar con firma del director <input type="checkbox"/> Coordinarse con <input type="checkbox"/> Anotar en agenda <input type="checkbox"/> Comunicarme <input type="checkbox"/> Tomar nota <input type="checkbox"/> Organizar reunión <input type="checkbox"/> Convocar a reunión <input type="checkbox"/> Acompañar a reunión <input type="checkbox"/> Para conocimiento <input type="checkbox"/> Realizar análisis e informar	
DESCRIPCION DE INSTRUCCIONES						
<p style="text-align: center;">Ing. Isaac Gavi Fregoso</p> <p style="text-align: center;">Dar seguimiento</p>						
FECHA DE RECIBIDO			Vo. Bo.			
			<p style="text-align: center;">Dar continuidad a las visitas</p>			
NOMBRE			DESPACHO			

RECIBIDO POR: elizabeth

URGENTE

Recabi original
Leonel R.C.
26/08/2019
12:00 hrs.



Tlaxcala, Tlax. a 22 de agosto de 2019
SEC-DA-1505/2019
Asunto: Envío documentación y
solicito visita en conjunto.

LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA JORGE LÓPEZ MÁRQUEZ
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA
DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
PRESENTE

En alcance a mi similar número SEC-DA-1495/2019 de fecha 21 de agosto del presente año, y en atención a la solicitud de documentación realizada de manera verbal por personal adscrito a esa Contraloría y seguimiento de la auditoría de número **UAG-AOR-227-2019 TLAX/PROAGUA-SECODUVI**, practicada por la Secretaría de Función Pública, aplicada a los recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (**PROAGUA**) correspondientes al ejercicio presupuestal dos mil dieciocho a través del cual le solicito de su apoyo para llevar a cabo una visita de inspección física en conjunto a la obra denominada "Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Intermunicipal "Nativitas", correspondiente al contrato de obra pública número PF/PTAR/027/18, con el propósito de verificar correcta ejecución de los trabajos y así complementar la documentación que será remitida a la S.F.P para solventar las observaciones que a continuación describo:

Observación número dos tipificada como: "Deficiencias en la ejecución de los trabajos (deficiencias técnicas) ... como resultado de la inspección física, se observaron, filtraciones de agua en los muros de concreto de los Reactores Anaerobios de Flujo Ascendente (RAFA 1 y RAFA 2) y los sedimentadores primario y secundario de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, asimismo, de la ejecución del concepto "08.1.2.15 Impermeabilización de azoteas a base de sellador e imprimador 2 capas revest impermeable con membrana de ref Intermedio aparente" en la azotea del área administrativa de la Planta de Tratamiento, se observaron deficiencias técnicas constructivas al presentar abolsamiento y desprendimiento del impermeabilizante en una área aproximada de 60.61 metros cuadrados, dichas observaciones se hicieron constar en la cedula de inspección de campo del 12 de junio de 2019..."

Anexo al presente copia simple del oficio número EVICSA-056/PTAR/027/2019 medio por el cual la empresa contratista adjunta reporte fotográfico de las correcciones realizados a lo anteriormente observado.

Observación número tres tipificada como: "Pagos improcedentes (Conceptos de obra pagados no ejecutados) ...el grupo auditor advirtió conceptos de obra no ejecutados por \$ 101,657.11 que se refieren principalmente a la inoculación, estabilización y puesta en marcha de la planta de tratamiento, suministro y colocación de pisos, azulejo y adocreto hexagonal..."

Adjunto en copia simple números generados, croquis y reporte fotográfico correspondiente a los conceptos de obra pública con clave número 08.1.2.10 y 08.1.2.11 ejecutados dentro de la estimación número seis del contrato observado.

Por lo anteriormente expuesto le solicito de su valiosa colaboración con el propósito de que gire sus apreciables instrucciones al personal responsable para que a la brevedad posible se lleve a cabo una visita de inspección física en conjunto a la obra antes referida.

Sin otro particular y seguro de contar con su apoyo, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C.P. CARLOS SÁNCHEZ TAMAYO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

C.c.p. CONTADOR PÚBLICO MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ. – Contralor del Ejecutivo. – Para su Conocimiento. – Presente.
C.c.p. ARQ. FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACTZI. – Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. – Mismo fin.
C.c.p. ING. PEDRO BAÑUELOS MORALES. – Director de Obras Públicas. – Mismo fin.
C.c.p. ING. ARQ. HILARIO ANTONIO TEXIS SÁNCHEZ. – Encargado de la Jefatura del Departamento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. – Mismo Fin.
C.c.p. ING. CARLOS OTERO SÁNCHEZ. – Residente de Obra adscrito a la Dirección de Obras Públicas. – Para su Conocimiento y Atención. – Presente.
Archivo
CST/grh




EVICSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
R.F.C. ECO140715S49
NUM. DE REG. PATRONAL IMSS F1317763101

OFICIO N°: EVICSA-056/PTAR/027/2019

ASUNTO: ATENCION A OBSERVACIONES

TLAXCALA, TLAX. A 20 DE AGOSTO DE 2019



ARQ. FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACTZI
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA
P R E S E N T E.

En atención al oficio N° DOP-OF-289/2019 enviado por el Director de Obras Públicas, perteneciente a esa Secretaría en comento esta empresa da la atención a la Auditoría número **TLAX-PROAGUA- SECODUVI-14/05/19-01** practicada por la Secretaría de la Función Pública Federal en Coordinación con la Contraloría del Ejecutivo en el Estado, a los recursos del **PROGRAMA: DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)**, correspondiente al ejercicio dos mil dieciocho, del contrato de obra pública No: **PF/PTAR/027/18, Convenio Modificatorio al Contrato No. PF/PTAR/027/A/18 Y Convenio Modificatorio al Contrato No. PF/PTAR/027/B/18** de fecha 01 de julio de 2019 mediante el cual comunica que ha concluido la auditoría practicada por los órganos de control firmándose acta administrativa de cierre de auditoría, y de las cuales se desprenden cédulas de observaciones que contienen las siguientes observaciones tipificadas como:

- Observación N° dos deficiencias en la ejecución y conclusión de los trabajos (deficiencias técnicas) Anexo I

Con referencia a las observaciones y de las filtraciones de agua en los muros de concreto de los Reactores Anaerobios de Flujo Ascendente (RAFA 1 y RAFA 2) y los Sedimentadores Primario y Secundario de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, asimismo, de la ejecución del concepto "08.1.2.15 Impermeabilización de azoteas a base de sellador e imprimador 2 capas revest impermeable con membrana de ref Intermedio aparente" en la azotea del área administrativa de la Planta de Tratamiento, se observaron deficiencias técnicas constructivas al presentar abolsamiento y desprendimiento del impermeabilizante en una área aproximada de 60.61 metros cuadrados, dichas observaciones se hicieron constar en la cédula de inspección de campo del 12 de junio de 2019,

1.- Para subsanar las observaciones se atiende al oficio antes mencionado, mediante el cual el Director de Obras Públicas de la Secretaría notifica al Administrador Único de la empresa Evicsa Construcciones S.A de C.V, las deficiencias presentadas como filtraciones en las estructuras Reactores Anaerobios de Flujo Ascendente (RAFA 1 y RAFA 2) y los sedimentadores primario y secundario de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y una vez identificada los elementos se procedió a realizar las reparaciones con un sello hermético preformado, especialmente formulado a base de componentes modificados y aditivos químicos, para proporcionar un enlace impermeable y eficiente en juntas entre elementos prefabricados sujetos a presión directa de agua como en elementos colados.

El sistema empleado para rectificar fugas, realizo con un impermeabilizante RETEX está compuesto por recubrimientos cementosos impermeables, de origen 100% mineral, los cuales se integran monolíticamente dentro de la superficie porosa de la estructura, ofreciendo así alta seguridad en impermeabilidad y amplia seguridad en higiene, al no contaminar y tampoco

evicsa@hotmail.com
tel. (2 4 6) 46 24024
Calle Xicohtencatl No. 27 San Hipolito Chimalpa, Tlaxcala



EVICSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
R.F.C. ECO140715S49
Calle Xicohtencatl No. 27
San Hipolito Chimalpa, Tlaxcala
Tel. (246) 4624024 evicsa@evicsa.com



EVICSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

R.F.C. ECO140715549

NUM. DE REG. PATRONAL IMSS F1317763101

incentivar el surgimiento de hongos y/o bacterias en dicha superficie. Los recubrimientos impermeabilizantes cementosos RETEX no son tóxicos, no contaminan, no se oxidan y no se descomponen por lo que son reconocidos ampliamente como seguros en su manejo y aplicación, y considerados óptimos para permanecer en contacto con agua potable. Así mismo, los Recubrimientos Cementosos "R" (reforzados) RETEX ofrecerán una excelente resistencia química y durabilidad ante el ataque de soluciones químicas diluidas y ante el ataque de sulfatos. El rango aproximado de resistencia química es de pH 4 a pH 10, y podrá variar de acuerdo a la concentración de los químicos y su temperatura.

Con el procedimiento de LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE para la aplicación en la superficie de concreto deberá estar libre de astillas, arena, pintura, membrana de curado, ó de cualquier suciedad que pudiese entorpecer la integración de los recubrimientos cementosos. Se recomienda utilizar cepillo de alambre para abrir en mayor proporción la porosidad de la estructura. En casos donde exista excesiva suciedad, ó en superficies pulidas, se recomienda martelinar ligeramente y en forma superficial para mejorar el anclaje de los productos RETEX. Finalmente, en casos extremos donde se dificulte la limpieza, se podrá utilizar una solución de ácido muriático al 10% amordentando de esta manera lo suficiente, posteriormente con agua y jabón en abundancia para eliminar en su totalidad la solución ácida, como se reporte en memoria fotográfica. (Anexo II)

2.-) Asimismo, de la ejecución del concepto "08.1.2.15 Impermeabilización de azoteas a base de sellador e imprimador 2 capas revest impermeable con membrana de ref Intermedio aparente" en la azotea del área administrativa de la Planta de Tratamiento, se observaron deficiencias técnicas constructivas al presentar abolsamiento y desprendimiento del impermeabilizante en una área aproximada de 60.61 metros cuadrados.

El sistema empleado para rectificar la Impermeabilización de azoteas a base de sellador e imprimador se realizó desinstalando el material que no cumplía con las especificaciones y deficiencias técnicas que no cumplían con las especificaciones requeridas, retirando en su totalidad el impermeabilizante existente de toda la parte de la azotea, nivelado con una capa de concreto dando el bombeo correspondiente hacia las bajadas de aguas pluviales, posteriormente se realizó la limpieza de la superficie para eliminar polvo, y se realizó la aplicación de primario asfáltico en toda la superficie para ayudar a la adherencia de la membrana.

Continuando con el proceso se realizó a la colocación de la membrana mediante un proceso de termo fusión, aplicando simultáneamente la flama del soplete con movimientos de izquierda a derecha por la cara inferior del rollo, como se demuestra en el reporte fotográfico (Anexo II).

Se anexa información de respaldo de lo antes mencionado en el punto N° 1, 2, reporte fotográfico.

Sin otro particular le agradezco la atención prestada, reciba un afectuoso saludo, quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE

ARQ. ESTEBAN FLORES PÉREZ
ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA
EVICSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.



EVICSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
RFC: ECO140715549
Calle Acoténcatl No.27
San Hipólito Chimalpa, Tlaxcala
Tel.(246) 4624024 evicsadev@outlook.com

c.c.p. Ing. Pedro Bañuelos Morales.- Director de Obras Públicas.
c.c.p. Ing. Arq. Hilario Antonio Taxis.- Encargado del Departamento De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
c.c.p. Archivo.

evicsa@hotmail.com
tel. (2 4 6) 46 24024
Calle Xicohtencatl No. 27 San Hipolito Chimalpa, Tlaxcala



EVICSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

R.F.C. ECO140715549

NUM. DE REG. PATRONAL IMSS F1317763101

En atención al oficio N° DOP-OF-289/2019 enviado por el Director de Obras Públicas, perteneciente a esa Secretaría en comento esta empresa da la atención a la Auditoría número **TLAX-PROAGUA- SECODUVI-14/05/19-01** practicada por la Secretaría de la Función Pública Federal en Coordinación con la Contraloría del Ejecutivo en el Estado, a los recursos del **PROGRAMA: DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)**, correspondiente al ejercicio dos mil dieciocho, del contrato de obra pública No: **PF/PTAR/027/18, Convenio Modificatorio al Contrato No. PF/PTAR/027/A/18 Y Convenio Modificatorio al Contrato No. PF/PTAR/027/B/18** de fecha 01 de julio de 2019 mediante el cual comunica que ha concluido la auditoría practicada por los órganos de control firmándose acta administrativa de cierre de auditoría, y de las cuales se desprenden cédulas de observaciones que contienen las siguientes observaciones tipificadas como:

- Observación N° dos deficiencias en la ejecución y conclusión de los trabajos (deficiencias técnicas) Anexo I

1.- Para subsanar las observaciones se atiende al oficio antes mencionado, mediante el cual el Director de Obras Públicas de la Secretaría notifica al Administrador Único de la empresa Evicsa Construcciones S.A de C.V, las deficiencias presentadas como filtraciones en las estructuras Reactores Anaerobios de Flujo Ascendente (RAFA 1 y RAFA 2) y los sedimentadores primario y secundario de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y una vez identificada los elementos se procedió a realizar las reparaciones con un sello hermético preformado, especialmente formulado a base de componentes modificados y aditivos químicos, para proporcionar un enlace impermeable y eficiente en juntas entre elementos prefabricados sujetos a presión directa de agua como en elementos colados.



Ilustración 1.- REPARACION FILTRACIONES EN TANQUES



EVICSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
R.F.C. ECO140715549
Calle Xicohtencatl No.27
San Hipolito Chimalpa, Tlaxcala
Tel.(246) 4624024 evicsa@outlook.com

evicsa@hotmail.com

tel. (2 4 6) 46 24024

Calle Xicohtencatl No. 27 San Hipolito Chimalpa, Tlaxcala



EVICSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
R.F.C. ECO140715S49
NUM. DE REG. PATRONAL IMSS F1317763101



Ilustración 2.- APLICACION DE SELLOTEX (RETEX)

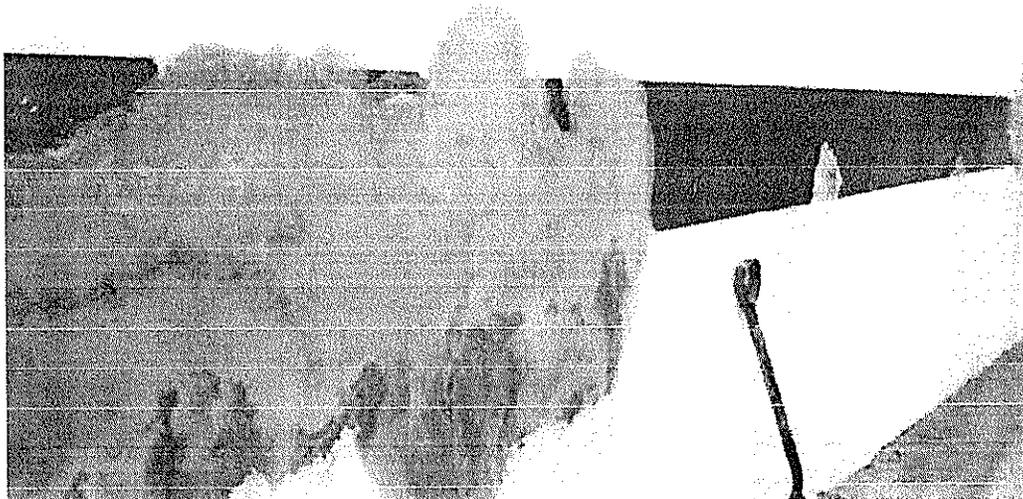


Ilustración 3.- REPARACION DE FUGAS EN TANQUES



EVICSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
R.F.C. ECO140715S49
Calle Azoténcatl No.27
San Hipólito Chimalpa, Tlaxcala
Tel.(246) 4624024 evicsadev@outlook.com




Ilustración 4.- REPARACION DE FUGAS CON APLICACION DE SELLOTEX (RETEX)

2.- Asimismo, de la ejecución del concepto "08.1.2.15 Impermeabilización de azoteas a base de sellador e imprimador 2 capas revest impermeable con membrana de ref intermedio aparente" en la azotea del área administrativa de la Planta de Tratamiento, se observaron deficiencias técnicas constructivas al presentar abolsamiento y desprendimiento del impermeabilizante en una área aproximada de 60.61 metros cuadrados.

El sistema empleado para rectificar Impermeabilización de azoteas a base de sellador e imprimador se realizó desinstalando el material que no cumplía con las especificaciones retirando en toda la parte de la azotea nivelado con una capa de concreto dando el bombeo correspondiente aplicando posteriormente las capas de imprimador 2 capas revest impermeable con membrana de ref intermedio aparente como se demuestra en memoria fotográfica (Anexo II).

EVICSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
R.F.C. ECO140715549
CALLE HIPOLITO CHIMALPA No. 27
SAN HIPOLITO CHIMALPA, TAMAULIPUS
TEL: (246) 4624024
EVICSA@HOTMAIL.COM



Ilustración 5.- DESINSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE



Ilustración 6.- RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EN AREAS ADMINISTRATIVAS

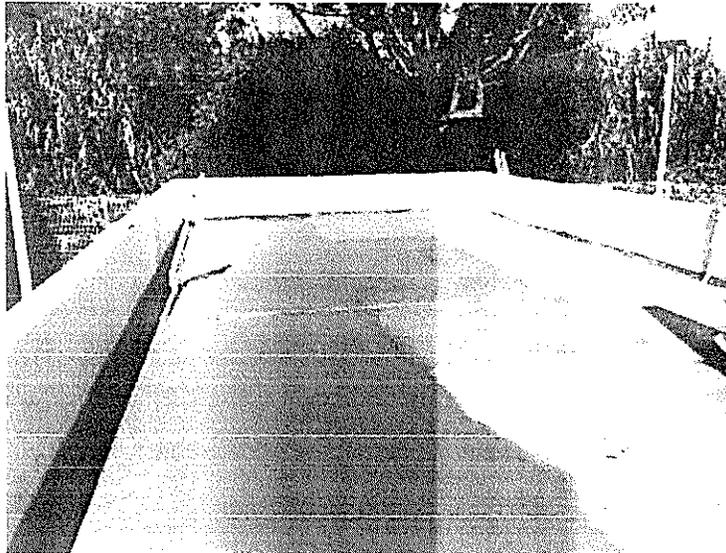


Ilustración 7.- RENOVACION DE LOSA DE AREAS ADMINISTRATIVAS



Ilustración 8.- BARRIDO DE LA SUPERFICIE

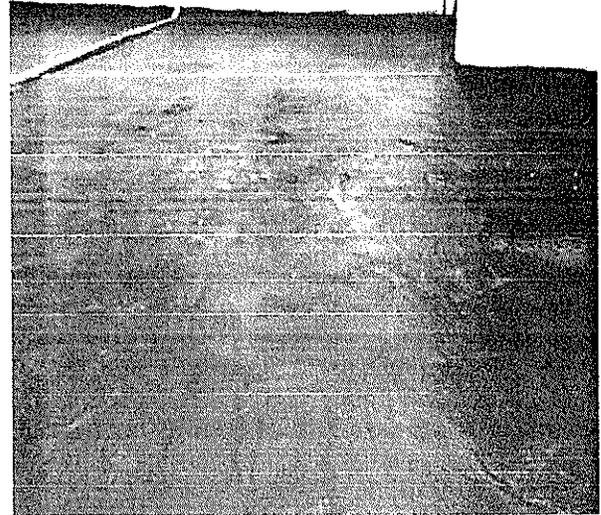



Ilustración 9.- APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO



Ilustración 10.- APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE



Ilustración 11.- APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE






GENERADORES	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INTERMUNICIPAL "NATIVITAS"
UBICACIÓN:	NATIVITAS, SAN BERNABÉ CAPUJA, SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, GUADALUPE VICTORIA, JESÚS TEPACTEPEC, SAN MIGUEL DEL MILAGRO Y SANTA APOLONIA TEACALCO, MUNICIPIOS DE NATIVITAS Y SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAXCALA.
CONTRATO N°:	PP/P7AR/027/18
ESTIMACIÓN N°:	6 (SEIS)
PERIODO DE CONTRATO:	
DEL 02 DE AGOSTO DE 2018 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018	
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONCEPTO:	
DEL 15 DE OCTUBRE DE 2018 AL 29 DE OCTUBRE DE 2018	
PERIODO DE FORMULACIÓN DE ESTA ESTIMACIÓN:	
DEL 15 DE OCTUBRE DE 2018 AL 29 DE OCTUBRE DE 2018	

CONS.	PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO										UNIDAD		
			EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	N° DE PIEZAS	TOTAL	OBSERVACIONES					
123	OBRA CIVIL: AREAS ADMINISTRATIVAS	08.1.2.10	PISOS, LAMBRINES Y ZOCLOS CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA LAMBRINES DE MOSAICO LISO O MARMOLEADO DE 1a. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3										M2.		
No.	LOCALIZACIÓN														
1	AREAS ADMINISTRATIVAS	C-A	1-2	3.820	4.080						15.586	PISO DE C. C. M.			
2	AREAS ADMINISTRATIVAS	C-A	2-4	2.500	4.080						10.200	PISO DE LABORATORIO			
3	AREAS ADMINISTRATIVAS	C-A	4-5	1.240	4.080						5.059	PISO DE SANITARIOS			
4	AREAS ADMINISTRATIVAS	C-A	5-6	2.240	4.080						9.139	PISO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS			
5	CASETA DE VIGILANCIA	A-C	1-2	1.430	2.780						3.975	PISO DE CASETA DE VIGILANCIA			
6	CASETA DE VIGILANCIA	A-C	2-3	3.040	2.780						8.451	PISO DE CASETA DE VIGILANCIA			
7	AREAS ADMINISTRATIVAS	C-A	1	4.080							0.408	ZOCLO DE C. C. M.			
8	AREAS ADMINISTRATIVAS	A	1-2	3.820							0.382	ZOCLO DE C. C. M.			
9	AREAS ADMINISTRATIVAS	C	1-2	2.300							0.230	ZOCLO DE C. C. M.			
10	AREAS ADMINISTRATIVAS	A	2-4	2.500							0.250	ZOCLO LABORATORIO			
11	AREAS ADMINISTRATIVAS	C	2-4	1.580							0.158	ZOCLO LABORATORIO			
12	AREAS ADMINISTRATIVAS	C-A	2	4.080							0.408	ZOCLO LABORATORIO			
13	AREAS ADMINISTRATIVAS	C-A	4	4.080							0.408	ZOCLO LABORATORIO			
14	AREAS ADMINISTRATIVAS	A	5-6	2.240							0.224	ZOCLO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS			
15	AREAS ADMINISTRATIVAS	C	5-6	1.320							0.132	ZOCLO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS			
16	AREAS ADMINISTRATIVAS	C-A	5	3.160							0.316	ZOCLO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS			
17	AREAS ADMINISTRATIVAS	C-A	6	4.080							0.408	ZOCLO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS			
18	CASETA DE VIGILANCIA	A-C	1	2.780							0.278	ZOCLO DE CASETA DE VIGILANCIA			
19	CASETA DE VIGILANCIA	A-C	2	1.860							0.186	ZOCLO DE CASETA DE VIGILANCIA			
20	CASETA DE VIGILANCIA	A	1-2	2.120							0.212	ZOCLO DE CASETA DE VIGILANCIA			
21	CASETA DE VIGILANCIA	C	1-2	3.040							0.304	ZOCLO DE CASETA DE VIGILANCIA			

TOTAL DE ESTA HOJA		56.714	M2.
--------------------	--	--------	-----


ELABORÓ: 

ING. MIGUEL VALQUEZ RAMIREZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA EVICSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

REVISÓ Y AUTORIZÓ: 

ING. CARLOS OTERO SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA SECODUVI

EVICSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
R.F.C. EVICSA
Calle Nacional No. 27
San Hipólito Chincipe, Tlaxcala
Tel (246) 482004 evicsa@evicsa.com




GENERADORES

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INTERMUNICIPAL "NATIVITAS"	CONTRATO N°:	PF/PTAR/027/18
UBICACIÓN:	NATIVITAS, SAN BERNABÉ CAPULA, SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, GUADALUPE VICTORIA, JESUS TEPACTEPEC, SAN MIGUEL DEL MILAGRO Y SANTA APOLOHIA TEACALCO, MUNICIPIOS DE NATIVITAS Y SANTA APOLOHIA TEACALCO, TLAXCALA.	ESTIMACION N°:	6 (SEIS)
CLAVE:	08.1.2.10	PERIODO DE CONTRATO:	DEL 02 DE AGOSTO DE 2018 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018
PARTIDA:	OBRA CIVIL: AREAS ADMINISTRATIVAS	PERIODO DE EJECUCION DEL CONCEPTO:	DEL 15 DE OCTUBRE DE 2018 AL 29 DE OCTUBRE DE 2018
CONS.:	123	PERIODO DE FORMULACION DE ESTA ESTIMACION:	DEL 15 DE OCTUBRE DE 2018 AL 29 DE OCTUBRE DE 2018
		UNIDAD:	M2.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

PISOS, LAMBRINES Y ZOCLOS CON TODOS LOS MATERIALES Y MANDO DE OBRA LAMBRINES DE MOSAICO LISO O MARMOLEDO DE 1a. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

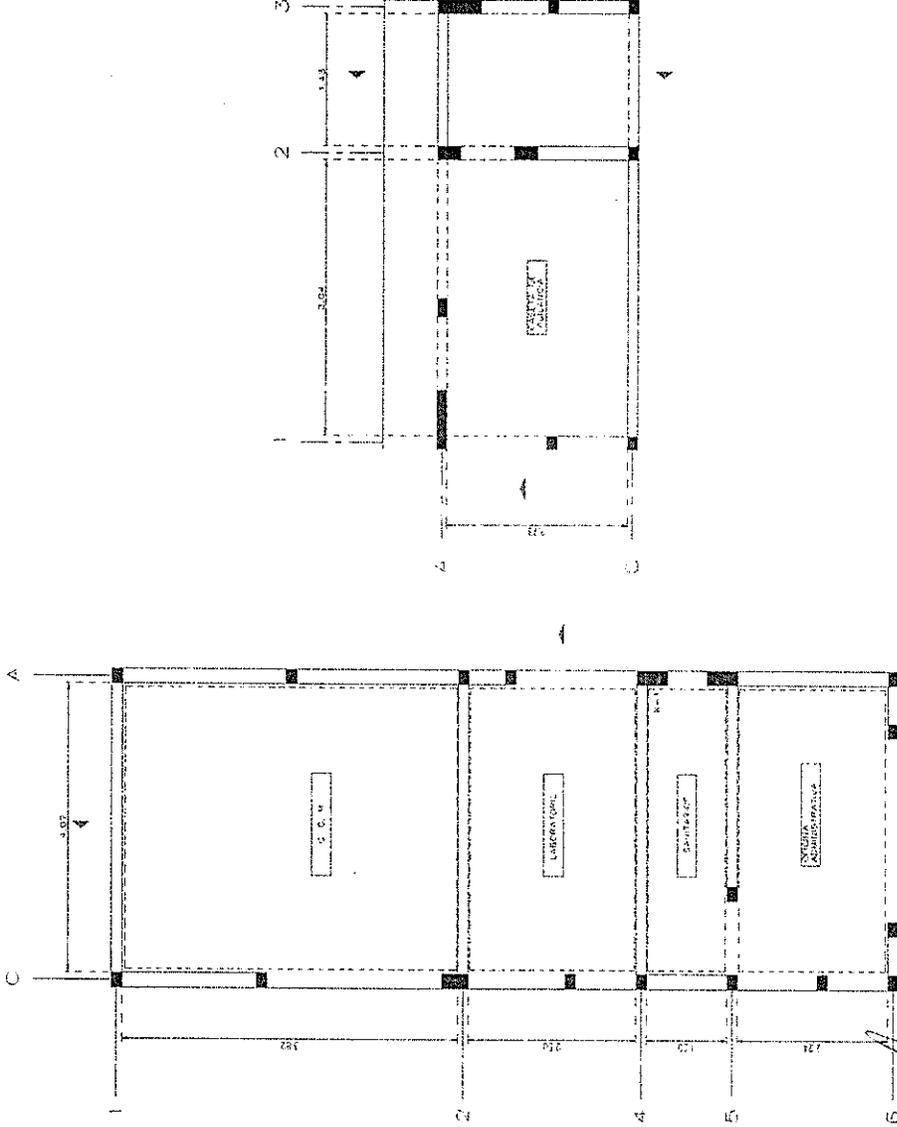

ELABORO:

ING. MIGUEL ANSEL VAZQUEZ RAMIREZ
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

EVICSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
RFC: PTT-4075589
Calle Nacional No. 27
San Hipólito Chavila, Tlaxcala
TEL (46) 4024021 evicsa@evicsa.com

REVISO Y AUTORIZO:

ING. CARLOS OTEBO-SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA SECODUVI

		REPORTE FOTOGRAFICO	
		OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INTERMUNICIPAL "NATIVITAS"	CONTRATO N°: P7/PTAR/027/18 ESTIMACION N°: 6 (SEIS)
UBICACIÓN: MIGUEL DEL MILAGRO Y SANTA APOLODIA TEACALCO, MUNICIPIOS DE NATIVITAS Y SANTA APOLODIA TEACALCO, TLAXCALA.		PERIODO DE EJECUCION DEL CONCEPTO: DEL 02 DE AGOSTO DE 2018 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018 PERIODO DE FORMULACION DE ESTA ESTIMACION: DEL 15 DE OCTUBRE DE 2018 AL 29 DE OCTUBRE DE 2018	
CONS. 123	PARTIDA OBRA CIVIL: AREAS ADMINISTRATIVAS	CLAVE 08.1.2.10	DESCRIPCION DEL CONCEPTO PISOS, LAMBRINES Y ZOCLOS CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA LAMBRINES DE MOSAICO LISO O MARMOLEDO DE 1a. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3
		UNIDAD M2.	

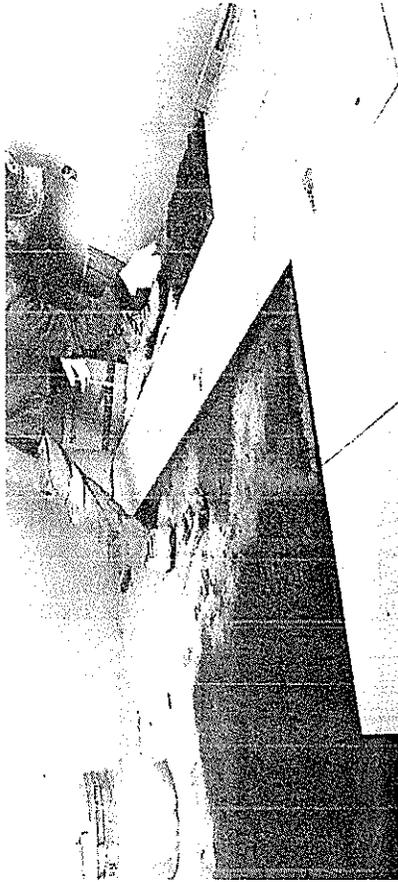


FOTO N° 1.- PISOS DE LOSETA EN AREAS ADMINISTRATIVAS






FOTO N° 2.- PISOS DE LOSETA EN AREAS ADMINISTRATIVAS


EVICSA
 CONSTRUCCIONES

EVICSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
 R.F.C. 15-12-1989
 Calle Avialtancal No. 77
 San Hipólito Chimalpa, Tlaxcala
 Tel: (562) 4321211 evicsa@evicsa.com

ELABORO:

 ING. MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ RAMÍREZ
 SUPERINTENDENTE DE OBRA EVICSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.


REVISO Y AUTORIZO:

 ING. CARLOS OTERO SANCHEZ
 SUPERVISOR DE OBRA SECODUVI




CONSTRUCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INTERMUNICIPAL "NATIVITAS"		GENERADORES							
OBRA:		CONTRATO N°:							
UBICACIÓN:		ESTIMACIÓN N°:							
CLAVE		PERIODO DE CONTRATO:							
PARTIDA		DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO							
CONSTRUCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INTERMUNICIPAL "NATIVITAS"		UNIDAD							
08.1.2.11		M2.							
PISO DE AZULEJO DE COLOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y LECHADO CON CEMENTO BLANCO									
No.	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	N° DE PIEZAS	TOTAL	OBSERVACIONES	
1	4	C-A	4.080		2.750	11.220	11.220	SANITARIOS DE AREAS ADMINISTRATIVAS	
2	5	C-A	4.080		2.750	11.220	11.220	SANITARIOS DE AREAS ADMINISTRATIVAS	
3	C	4-5	1.240		2.750	3.410	3.410	SANITARIOS DE AREAS ADMINISTRATIVAS	
4	A	4-5	1.200		2.750	3.300	3.300	SANITARIOS DE AREAS ADMINISTRATIVAS	
5	A	4-5	0.900		0.580	-0.342	-0.342	AREA DE VENTANA	
6	C	A-C	0.900		2.350	-2.115	-2.115	AREA DE PUERTA	
7	C	2-3	1.430		2.750	3.933	3.933	SANITARIOS DE CASETA DE VIGILANCIA	
8	2	A-C	1.720		2.750	4.730	4.730	SANITARIOS DE CASETA DE VIGILANCIA	
9	3	A-C	1.280		2.750	3.570	3.570	SANITARIOS DE CASETA DE VIGILANCIA	
10	3	A-C	1.430		0.580	-0.844	-0.844	AREA DE VENTANA	
TOTAL DE ESTA HOJA							38.032		M2.



EVICSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
 RUC: P1001015388
 Calle Académica No. 77
 San Marcos Chimalpa, Tlaxcala
 Tel: (246) 651021 evicsa@evicsa.com

REVISO Y AUTORIZO:

ING. CARLOS OTERO SANCHEZ
 SUPERVISOR DE OBRA SECODUVI

ELABORADO:

ING. MIGUEL ANGEL RAMIREZ
 SUPERINTENDENTE DE OBRA EVICSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



REPORTE FOTOGRAFICO

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INTERMUNICIPAL "NATIVITAS"

UBICACIÓN: SAN BERNABÉ CAPULA, SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, GUADALUPE VICTORIA, JESÚS TEPACTEPEC, SAN MIGUEL DEL MILAGRO Y SANTA APOLONIA TEACALCO, MUNICIPIOS DE NATIVITAS Y SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAXCALA.

CONTRATO N°:	PF/PTAR/027/18
ESTIMACIÓN N°:	6 (SEIS)
PERIODO DE CONTRATO:	DEL 02 DE AGOSTO DE 2018 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONCEPTO:	DEL 15 DE OCTUBRE DE 2018 AL 29 DE OCTUBRE DE 2018
PERIODO DE FORMULACIÓN DE ESTA ESTIMACIÓN:	DEL 15 DE OCTUBRE DE 2018 AL 29 DE OCTUBRE DE 2018

CONS.	124	PARTIDA	OBRA CIVIL: AREAS ADMINISTRATIVAS	CLAVE	08.1.2.11	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	PISO DE AZULEJO DE COLOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO	UNIDAD	M2.
-------	-----	---------	-----------------------------------	-------	-----------	--------------------------	--	--------	-----



FOTO N° 1: COLOCACION DE AZULEJO EN SANITARIOS




FOTO N° 3: COLOCACION DE AZULEJO EN SANITARIOS

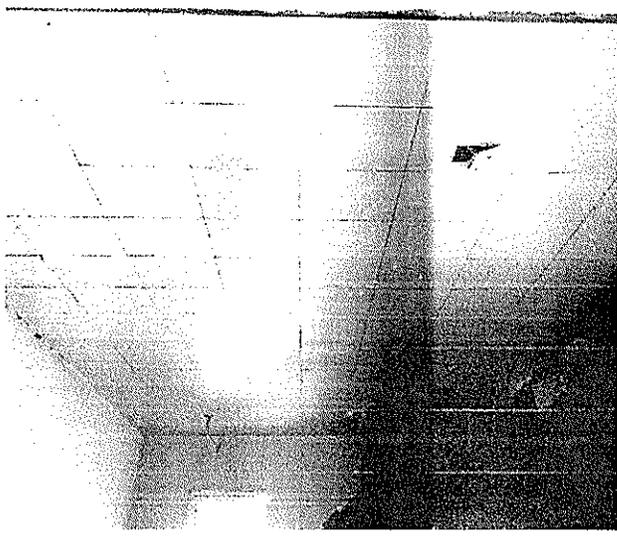


FOTO N° 4: COLOCACION DE AZULEJO EN SANITARIOS

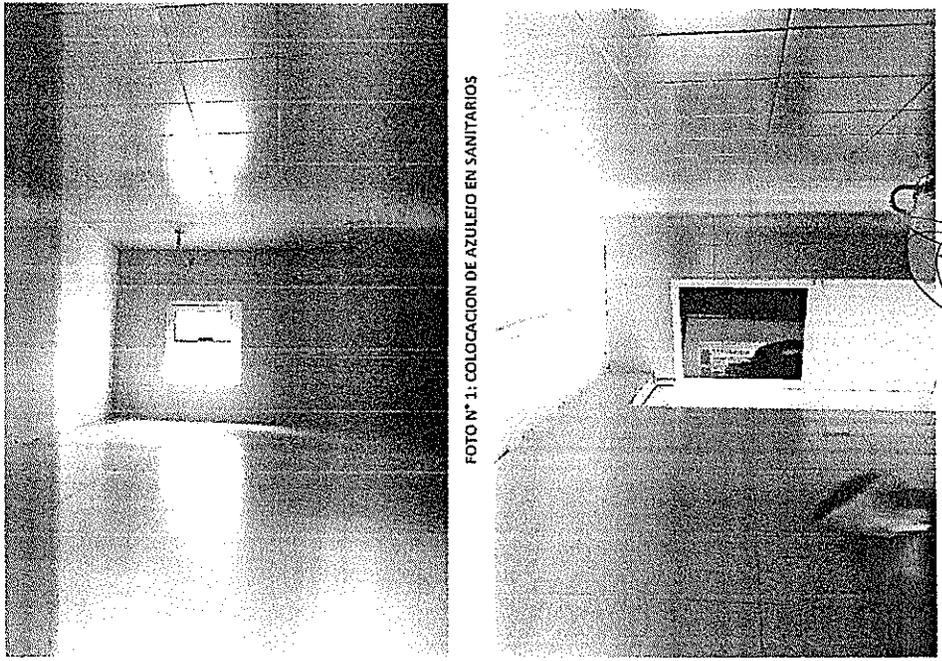


FOTO N° 2: AZULEJO EN MUEBOS DE SANITARIOS EN AREAS ADMINISTRATIVAS

ELABORÓ:

ING. MIGUEL ANGELO VAQUÍEZ RAMÍREZ
SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE EVICSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ING. CARLOS OTERO SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA SECODUVI

EVICSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
R.C.F. 013549
Calle Antitaca No. 27
San Hipólito Chiriquá, Tlaxcala
Tel: (562) 454021 | evicsa@outlook.com



C.P. Trece: Registrar e integrar en control de folios
Ing. Leonel: P (su envío a S.F.F.)

FOLIO	FECHA CAPTURA	FECHA DOCUMENTO	REFERENCIA	CLAVE					
5500	22/08/2019	22/08/2019	Oficio	SECODUVI-1526/2019					
NOMBRE									
C.P. Carlos Sanchez Tamayo									
CARGO			DEPENDENCIA						
Director Administrativo de la			Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda.						
ASUNTO									
Remite solventación de observaciones dictadas dentro de la auditoría UAG-AOR-227-2019 TLAX-PROAGUA-SECODUVI.									
TRAMITE		TURNADO							
<input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Importante <input type="checkbox"/> Urgente		<input type="checkbox"/> Despacho <input type="checkbox"/> Direccion Administrativa <input type="checkbox"/> Dirección Jurídica <input type="checkbox"/> Dirección de Modernización a la Administración Pública y Participación Social <input checked="" type="checkbox"/> Direccion de Supervisión, Fiscalizacion, Control y Auditoria <input type="checkbox"/> Dirección de Informática <input type="checkbox"/> Contraloría Interna							
INSTRUCCIONES									
<input checked="" type="checkbox"/> Dar seguimiento <input checked="" type="checkbox"/> Hacerse cargo <input type="checkbox"/> Investigar asunto <input type="checkbox"/> Proporcionar antecedentes <input type="checkbox"/> Informar en acuerdo <input type="checkbox"/> Comentar con nota informativa <input type="checkbox"/> Asistir <input type="checkbox"/> Asistir en representación <input type="checkbox"/> Agradecer <input type="checkbox"/> Disculpar <input type="checkbox"/> Valorar <input type="checkbox"/> Contestar con firma del titular					<input type="checkbox"/> Preparar síntesis ejecutiva <input type="checkbox"/> Archivar <input type="checkbox"/> Contestar con firma del director <input type="checkbox"/> Coordinarse con <input type="checkbox"/> Anotar en agenda <input type="checkbox"/> Comunicarme <input type="checkbox"/> Tomar nota <input type="checkbox"/> Organizar reunión <input type="checkbox"/> Convocar a reunión <input type="checkbox"/> Acompañar a reunión <input type="checkbox"/> Para conocimiento <input type="checkbox"/> Realizar análisis e informar				
DESCRIPCION DE INSTRUCCIONES									
Ing. Isaac García Jopon Dar seguimiento									
FECHA DE RECIBIDO			Vo. Bo.						
ofewo SFP			X						
NOMBRE			DESPACHO						



RECIBIDO POR: elizabeth

Recibi copia
Ing. Leonel R.C.
02/09/2019
8:35 hrs.


Informativa URBANOS P/A

Tlaxcala, Tlax. a 22 de agosto de 2019

SECODUVI-1526/2019

Asunto: Envío propuesta de solventación. 5500

LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA JORGE LÓPEZ MÁRQUEZ
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA
DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
PRESENTE



En seguimiento de la auditoría número UAG-AOR-227-2019 TLAX-PROAGUA-SECODUVI aplicada a los recursos del Programa de agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) correspondientes al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, notificada por el Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría social de la Secretaría de la Función Pública mediante oficio número UORCS/211/1481/2019 de fecha 08 de mayo del presente año, y que hizo llegar mediante oficio número CE/DSFCA/AOPS/19-05-1274 de fecha 9 de mayo del presente año misma que fue practicada por la Secretaría de la Función Pública en coordinación con esa Contraloría, y en atención a los pliegos de observaciones emitidos como resultado de los trabajos de fiscalización de la auditoría antes mencionada, y para entender las observaciones emitidas anexo al presente la siguiente información como a continuación se detalla:

Observación correctiva número uno tipificada como: Incumplimiento en el procedimiento de adjudicación de obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. "... los expediente de obra pública de los contratos numero PF/APAUR/011/18 "Construcción de colectores y emisores (primera etapa)" y PF/APAUR/027/18 "construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales intermunicipal" Nativitas", en el cual se observo que el procedimiento de licitación número LO-929004994-E14-2018, en específico en el documento numero 20.1 análisis, cálculo de la integración de costos indirectos correspondientes a oficinas centrales y de campo, no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria conforme al formato número 19..."

Para atender esta observación adjunto al presente en original de la propuesta de solventación que consta de una caratula y siete fojas útiles, así como sus anexos que a continuación se describen.

Anexo 1, contiene copia certificada que corresponde a la caratula de la convocatoria y la cláusula decima cuarta documento 20 obligatorio de la convocatoria del contrato PF/APAUR/027/18, que consta de 3 fojas útiles.

Anexo 2, contiene copia certificada que corresponde a la caratula de la convocatoria y formato No 19 de la convocatoria del contrato PF/APAUR/027/18, que consta de 3 fojas útiles.

Anexo 3, impresión de las paginas número 1,17,28,29,70 y 71 del Reglamento de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Anexo 4, impresión de las paginas número 1 y 22 de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Anexo 5, copia certificada correspondiente a la caratula de la convocatoria y la cláusula primera de la convocatoria del contrato PF/APAUR/027/18, que consta de 3 fojas útiles.

Anexo 6, copia certificada correspondiente a la caratula de la convocatoria, la cláusula decima cuarta documento obligatorio, formato No 19 de la convocatoria y análisis y calculo del costo indirecto de la licitación del contrato PF/APAUR/027/18 que consta de 7 fojas útiles.

Anexo 7, copia certificada correspondiente a la caratula de la convocatoria, la cláusula decima cuarta del contrato PF/APAUR/027/18 que consta de 3 fojas útiles.

Anexo 8, copia certificada del análisis de precios unitarios de la licitación del contrato PF/APAUR/027/18.

Para la observación preventiva número uno adjunto copia debidamente certificada los oficios de instrucción con número **SECODUVI-1308/2019**.

Observación número dos tipificada como: *“Deficiencias en la ejecución de los trabajos (deficiencias técnicas) ... como resultado de la inspección física, se observaron, filtraciones de agua en los muros de concreto de los Reactores Anaerobios de Flujo Ascendente (RAFA 1 y RAFA 2) y los sedimentadores primario y secundario de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, asimismo, de la ejecución del concepto “08.1.2.15 Impermeabilización de azoteas a base de sellador e imprimador 2 capas revest impermeable con membrana de ref Intermedio aparente” en la azotea del área administrativa de la Planta de Tratamiento, se observaron deficiencias técnicas constructivas al presentar abolsamiento y desprendimiento del impermeabilizante en una área aproximada de 60.61 metros cuadrados, dichas observaciones se hicieron constar en la cedula de inspección de campo del 12 de junio de 2019...”*.

Al respecto para atender esta observación se adjunta al presente en original propuesta de solventación, Anexo 1 copia certificada del oficio número DOP-289/2019 y tabla de distribución de recursos por concepto de fecha 4 de julio de 2019 constante de 2 fojas útiles.

Anexo 2 copia certificada del oficio número EVICSA-056/PTAR/027/2019 de fecha 20 de agosto de 2019 y reporte fotográfico en el que la empresa contratista notifica de las reparaciones realizadas a la obra amparada bajo el contrato de obra número PF/PTAR/027/2019 que consta de 08 fojas útiles.

Anexo 3 copia certificada del oficio número SEC-DA-1505/2019 de fecha 22 de agosto del presente año a través del cual esta Secretaría solicito a esa Contraloría visita en conjunto para corroborar los trabajos

corregidos por la empresa contratista misma que notifico mediante oficio número EVICSA-056/PTAR/027/2019 que consta de 07 fojas útiles.

Anexo 4 copia certificada del oficio número SEC-DA-1505/2019 de fecha 22 de agosto del presente año a través del cual esta Secretaría solicito a esa Contraloría visita en conjunto para corroborar los trabajos corregidos que consta de 2 fojas útiles y reporte fotográfico de manera impresa y debidamente firmado por el residente de obra que consta de 3 fojas.

Para la observación preventiva número uno adjunto copia debidamente certificada los oficios de instrucción con número **SECODUVI-1306/2019** (Anexo VI) y **DOP-OF-380/2019** (Anexo V)

Observación número tres tipificada como: *“Pagos improcedentes (Conceptos de obra pagados no ejecutados) ...el grupo auditor advirtió conceptos de obra no ejecutados por \$ 101,657.11 que se refieren principalmente a la inoculación, estabilización y puesta en marcha de la planta de tratamiento, suministro y colocación de pisos, azulejo y adocreto hexagonal...”*.

Al respecto para atender esta observación se adjunta al presente en original propuesta de solventación, anexo 1 copia certificada del acuse de recibido del oficio de atención a observaciones numero DOP-OF-289/2019, y table de distribución de recursos por concepto, de fecha 4 de julio de 2019.

Anexo 2 copia certificada del oficio de atención a observaciones número EVICSA-055/PTAR/07/2019, generador, croquis y reporte fotográfico de fecha 20 de agosto de 2019.

Anexo 3 copia certificada del acuse de recibido del oficio de número SEC-DA-1505/2019 de envió de documentación y solicitud de visita en conjunto a observaciones, y generador de obra de concepto de concepto clave 08.1.2.10, croquis reporte fotográfico de la estimación número 6, de fecha 22 de agosto de 2019.

Anexo 4 copia certificada del acuse de recibido del oficio número SEC-DA-1505/2019 de envió de documentación y solicitud de visita en conjunto a observaciones, y generador de obra de concepto de concepto clave 08.1.2.11, croquis reporte fotográfico de la estimación número 6, de fecha 22 de agosto de 2019.

Anexo V copia certificada del acuse de recibido del oficio número SECODUVI-1208/2019 donde se solicita a la Dirección Local de la Comisión Nacional Agua en Tlaxcala, línea de captura para reintegro por la cantidad de \$17,341.90 a favor de la Tesorería de la Federación “TESOFE” de fecha 5 de agosto de 2019, copia certificada de la línea de captura 0019ABMY423750969458 del reintegro a la TESOFE por la cantidad antes mencionada.

Anexo VI copia certificada del acuse de recibido del oficio de atención a copia certificada de las pólizas de los depósitos por pagos de conceptos no ejecutados número SEC-DA1387/2019, y estado de cuenta bancario donde refleja los movimientos realizados de fecha 9 de agosto de 2019.

Para la observación preventiva número uno adjunto copia debidamente certificada los oficios de instrucción con número SECODUVI-1306/2019 de fecha 21 de agosto de 2019 Anexo VII, y acuse de recibido del oficio de instrucción número DOP-OF-380/2019 de 21 de agosto de 2019 Anexo VIII.

Solicitándole atentamente que por medio de su amable conducto se hagan llegar a la S.F.P. dicha documentación a efecto de subsanar la observación emitida por dicho ente fiscalizador, a fin de liberar al Estado de esta responsabilidad.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un saludo cordial.

ATENTAMENTE


C.P. CARLOS SÁNCHEZ TAMAYO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

C.c.p. **MTRO. EN AUDITORIA A OBRA PÚBLICA OMAR JIMÉNEZ ALVARADO.** – Visitador Regional de la Unidad de Operación regional y Contraloría Social de la Secretaría de Función Pública. - Para su conocimiento. – Presente.

C.c.p. **CONTADOR PÚBLICO MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ.** – Contralor del Ejecutivo. – Para su Conocimiento. – Presente.

C.c.p. **ARQ. FRANCISCO JAVIER ROMERO AHUACTZI.** – Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. – Mismo fin.

C.c.p. **ING. PEDRO BAÑUELOS MORALES.** – Director de Obras Públicas. – Mismo fin.

C.c.p. **ING. ARQ. HILARIO ANTONIO TEXIS SÁNCHEZ.** – Encargado de la del Departamento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. - Mismo fin.

El Acuse Original Obra en Poder de la Dirección Administrativa en el Archivo del Área de Seguimiento a Auditorías

Archivo

FJRA/CST/grh
